Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	% completado	Comienzo
1			**BC+IA - Gantt de implementación**	**90 días**		**16%**	**vie 12/19/25**
2	✓		H1 - Inicio de Etapa de Preparación Inicial	0 días		100%	vie 12/19/25
3	✓		**Etapa de Preparación Inicial**	**7 días**		**100%**	**vie 12/19/25**
4	✓		Kick off	1 día	2	100%	vie 12/19/25
5	✓		Planificación detallada BC+IA	6 días	4	100%	lun 12/22/25
6	✓		H2 - Fin Etapa de Preparación Inicial	0 días	5	100%	vie 1/2/26
7	✓		**Etapa de Business Blueprint**	**30 días**		**100%**	**lun 1/5/26**
8	✓		Sesiones de relevamiento	11 días	6	100%	lun 1/5/26
9	✓		Redacción de BBP BC+IA	14 días	8	100%	mar 1/20/26
10	✓		Validación de BBP con key users	5 días	9	100%	lun 2/9/26
11	✓		H3 - Fin Etapa de Business Blueprint	0 días	10	100%	vie 2/13/26
12			**Etapa de Conexión**	**8 días**		**92%**	**mié 2/18/26**
13	✓		Creación de Infraestructura en Google Cloud	3 días	11	100%	mié 2/18/26
14			Instalación de servidores xECM	8 días		86%	mié 2/18/26
15	✓		Base de datos (SQL Server)	3 días	11	100%	mié 2/18/26
16	✓		Archive Center	2 días	15	100%	lun 2/23/26
17	✓		Backend Content Server	3 días	16	100%	mié 2/25/26
18			Frontend Content Server	3 días	16	50%	mié 2/25/26
19	✓		Instalación de servidores IA	2 días		100%	lun 2/23/26
20	✓		Instalación Airflow + Langfuse	2 días	13	100%	lun 2/23/26
21	✓		Instalación VectorDB + Platform DB	1 día	13	100%	lun 2/23/26

Proyecto: BC+IA - Gantt de Implementación.mpp
Fecha: mié 2/25/26

Tarea	Tarea manual
División	Sólo duración
Hito	Informe de resumen manual
Resumen	Resumen manual
Resumen del proyecto	Sólo el comienzo
Tareas externas	Sólo fin
Hito externo	Fecha límite
Tarea inactiva	Progreso
Hito inactivo	Progreso manual
Resumen inactivo	

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	% completado	Comienzo
22	✓		Instalación IA Platform	1 día	21	100%	mar 2/24/26
23			H4 - Fin Etapa de Conexión	0 días	14,19	0%	vie 2/27/26
24			**Etapa de Realización**	**35 días**		**0%**	**mié 2/18/26**
25			Configuración inicial	9 días		0%	lun 3/2/26
26			Archive Center	2 días	14	0%	lun 3/2/26
27			OTDS	2 días	14	0%	lun 3/2/26
28			xECM	4 días	27	0%	mié 3/4/26
29			**Conexión Directorio Activo**	**9 días**		**0%**	**lun 3/2/26**
30			Creación de usuario de conexión (Macro)	1 día	23	0%	lun 3/2/26
31			Creación de grupo en Directorio Activo (Macro)	1 día	30	0%	mar 3/3/26
32			Suministro de datos a ITMind (Macro)	1 día	31	0%	mié 3/4/26
33			Conexión Directorio Activo	3 días	28,32	0%	mar 3/10/26
34			Configuración xECM	25 días		0%	mié 2/18/26
35			**Estructura de carpetas**	**15 días**		**0%**	**mié 2/18/26**
36			Entrega de la estructura de carpetas final (Macro)	14 días	11	0%	mié 2/18/26
37			Configuración de estructura de carpetas	1 día	36,28	0%	mar 3/10/26
38			**Categorías OT**	**16 días**		**0%**	**mié 2/18/26**
39			Entrega de Categorías OT finales (Macro)	15 días	11	0%	mié 2/18/26
40			Configuración Categorías OT	1 día	35	0%	mié 3/11/26
41			Zonas de negocio	1 día	40	0%	jue 3/12/26
42			Flujos de trabajo	3 días	41	0%	vie 3/13/26

Proyecto: BC+IA - Gantt de Implementación.mpp
Fecha: mié 2/25/26

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	% completado	Comienzo
43			**Roles**	**22 días**		**0%**	**mié 2/18/26**
44			Definición de listado de roles (Macro)	20 días	11	0%	mié 2/18/26
45			Configuración de Roles	2 días	42,44	0%	mié 3/18/26
46			**Reportes**	**23 días**		**0%**	**mié 2/18/26**
47			Definición de reportes necesarios (Macro)	21 días	11	0%	mié 2/18/26
48			Configuración de Reportes	2 días	42,47	0%	jue 3/19/26
49			Búsquedas avanzadas	2 días	45,48,44,47	0%	mié 3/25/26
50			**Vistas personalizadas**	**24 días**		**0%**	**mié 2/18/26**
51			Compartir a Macro UX lista de opciones a personalizar	13 días	11	0%	mié 2/18/26
52			Enviar resultado de parámetros personalizados aITMind (Macro)	10 días	51	0%	lun 3/9/26
53			Configuración de vistas personalizadas	1 día	52,45,48	0%	mié 3/25/26
54			Configuración IA DEV	16 días		0%	lun 3/2/26
55			Conexión interna xECM	1 día	28	0%	mar 3/10/26
56			Configuración VectorDB + Platform DB	2 días	23	0%	lun 3/2/26
57			Configuración Pipeline de Documentos	3 días	56	0%	mié 3/4/26
58			Configuración Plataforma IA	3 días	56	0%	mié 3/4/26
59			Sincronización xECM Roles y Permisos - Metadata	1 día	58,57,45,40,44	0%	vie 3/20/26
60			Testing plataforma IA	1 día	59	0%	mié 3/25/26
61			**Entrenamiento IA**	**23 días**		**0%**	**mié 2/18/26**

Proyecto: BC+IA - Gantt de Implementación.mpp
Fecha: mié 2/25/26

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	% completado	Comienzo
62			Disponibilizacion de información para entrenamiento IA (Macro)	1 día	11	0%	mié 2/18/26
63			Entrenamiento y refinamiento IA	18 días	19	0%	mié 2/25/26
64			Pruebas DEV	2 días	34	0%	vie 3/27/26
65			Customizing Escenarios - IA con xECM	7 días	45,44	0%	vie 3/20/26
66			Transporte de configuración DEV a QAS	2 días	63,64,62	0%	mar 3/31/26
67			**Pruebas QAS**	**35 días**		**0%**	**mié 2/18/26**
68			Revisar agenda de key users para capacitación	1 día	11	0%	mié 2/18/26
69			Capacitación key users xECM	1 día		0%	lun 4/6/26
70			Sesión de capacitación key users CAT	1 día	66	0%	lun 4/6/26
71			Sesión de capacitación key users RRHH	1 día	66	0%	lun 4/6/26
72			Disponibilización Script Pruebas QAS	1 día	66	0%	lun 4/6/26
73			Capacitación key users IA	1 día		0%	lun 4/6/26
74			Sesión de capacitación key users CAT	1 día	66	0%	lun 4/6/26
75			Sesión de capacitación key users RRHH	1 día	66	0%	lun 4/6/26
76			Entrega de material de soporte (funcional) Draft	1 día	72	0%	mar 4/7/26
77			Entrega de material de soporte (técnico) Draft	1 día	72	0%	mar 4/7/26
78			Pruebas QAS	5 días	69,73,68,72	0%	mar 4/7/26
79			H5 - Fin Etapa de Realización	0 días	78,77,76	0%	lun 4/13/26
80			**Migración BC**	**45 días**		**0%**	**mié 2/18/26**
81			Extracción de información (Macro)	29 días	11	0%	mié 2/18/26
82			**Disponibilización de información (Macro)**	**29 días**		**0%**	**mié 2/18/26**

Proyecto: BC+IA - Gantt de Implementación.mpp
Fecha: mié 2/25/26

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	% completado	Comienzo
83			Generar documentos xml / pdf	28 días	11	0%	mié 2/18/26
84			Compartirlos en algún espacio para que ITMind pueda hacer uso de ellos	1 día	83	0%	mié 4/1/26
85			Pruebas migratorias (Escenario Test)	5 días	84,83	0%	lun 4/6/26
86			Migración a xECM - Definitivo PRD	5 días	90	0%	mar 4/21/26
87			H6 - Fin Migración BC	0 días	86	0%	lun 4/27/26
88			**Etapa de Preparación Final**	**79 días**		**0%**	**vie 12/19/25**
89			Tareas de preproducción IA	5 días	78,77,76	0%	mar 4/14/26
90			Tareas de cutover xECM PRD	5 días	78,77,76	0%	mar 4/14/26
91			Tareas de cutover IA PRD	5 días	78,77,76	0%	mar 4/14/26
92			Revisar agenda de key users para pruebas	1 día	2	0%	vie 12/19/25
93			Pruebas de aceptación pre Go-Live	2 días		0%	mar 4/21/26
94			Pruebas con key users CAT+IA	2 días	90	0%	mar 4/21/26
95			Pruebas con key users RRHH+IA	2 días	90	0%	mar 4/21/26
96			Revisar agenda de usuarios para capacitación	1 día	2	0%	vie 12/19/25
97			Capacitación a usuarios	1 día		0%	mar 4/21/26
98			Entrega de material de soporte (funcional)	1 día	91	0%	mar 4/21/26
99			Entrega de material de soporte (técnico)	1 día	91	0%	mar 4/21/26
100			Sesión de capacitación usuarios finales CAT	1 día	91	0%	mar 4/21/26
101			Sesión de capacitación usuarios finales RRHH	1 día	91	0%	mar 4/21/26

Proyecto: BC+IA - Gantt de Implementación.mpp
Fecha: mié 2/25/26

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	% completado	Comienzo
102			Sesión de capacitación IT	1 día	91	0%	mar 4/21/26
103			**Etapa de Lanzamiento**	**5 días**		**0%**	**mié 4/22/26**
104			Go Live BC+IA	5 días	102	0%	mié 4/22/26
105			H7 - Fin Etapa de Lanzamiento	0 días	104	0%	mar 4/28/26
106			**Etapa de Soporte y Mejoras**	**10 días**		**0%**	**vie 4/24/26**
107			Soporte Post-Go Live BC+IA	10 días		0%	vie 4/24/26
108			H8 - Fin Etapa de Soporte y Mejoras	0 días	107	0%	vie 5/8/26

Proyecto: BC+IA - Gantt de Implementación.mpp
Fecha: mié 2/25/26

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

Fin
vie 5/8/26
vie 12/19/25
vie 1/2/26
vie 12/19/25
vie 1/2/26
vie 1/2/26
vie 2/13/26
lun 1/19/26
vie 2/6/26
vie 2/13/26
vie 2/13/26
vie 2/27/26
vie 2/20/26
vie 2/27/26
vie 2/20/26
mar 2/24/26
vie 2/27/26
vie 2/27/26
mar 2/24/26
mar 2/24/26
lun 2/23/26

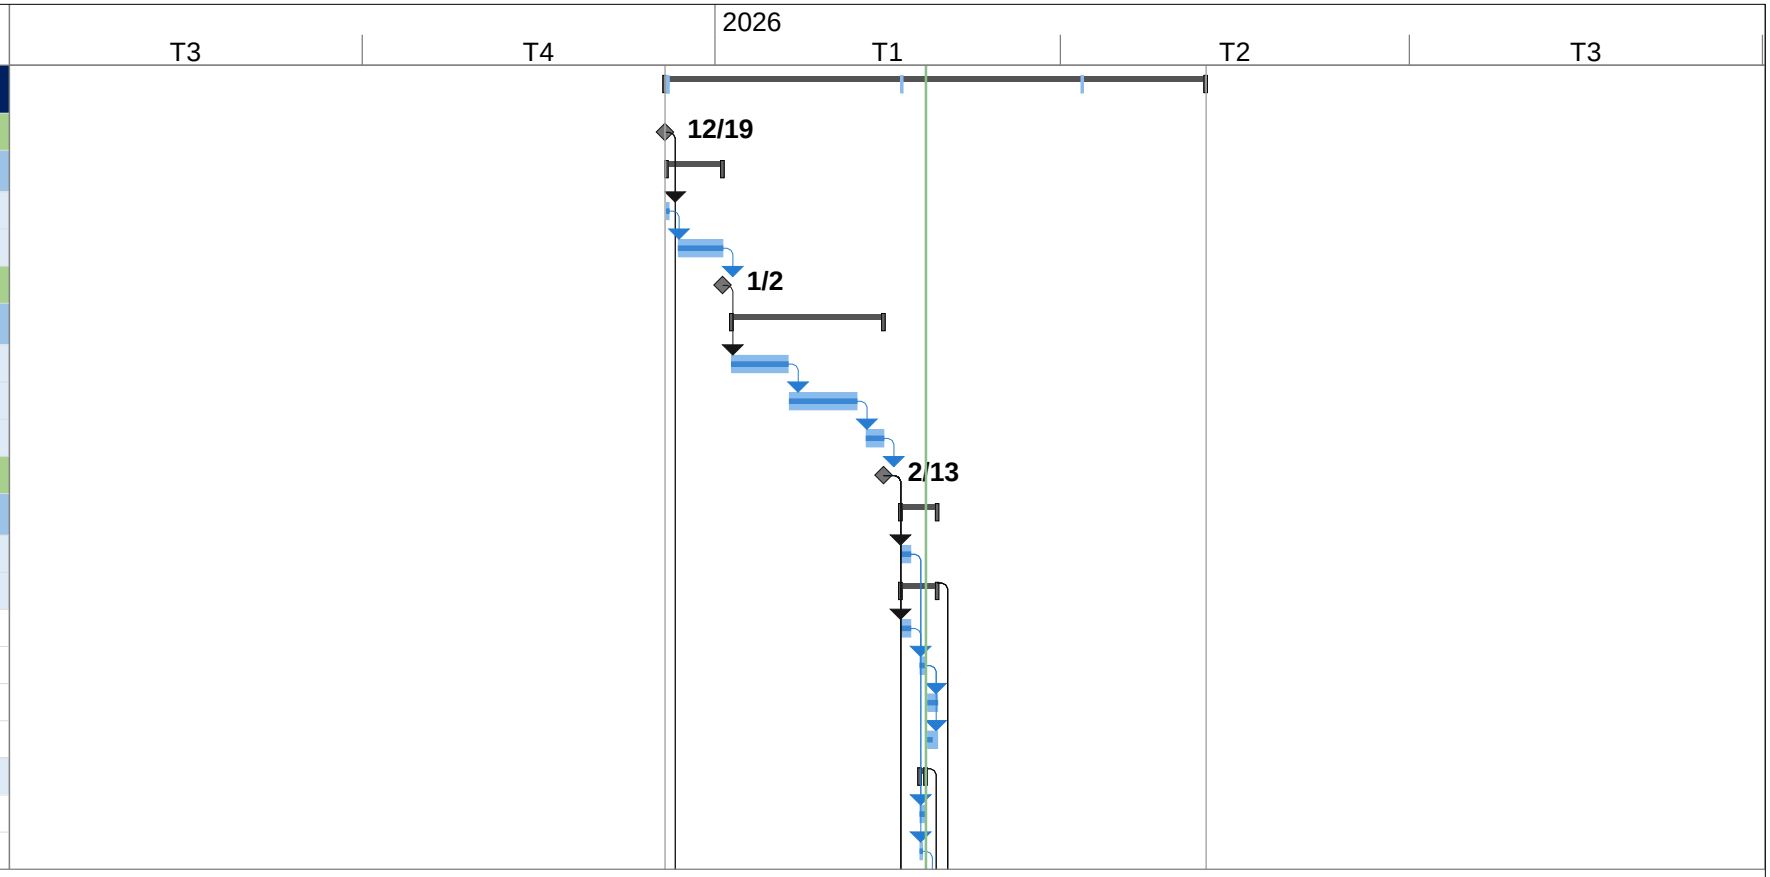

Proyecto: BC+IA - Gantt de Implementación.mpp
Fecha: mié 2/25/26

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

Fin
mar 2/24/26
vie 2/27/26
lun 4/13/26
jue 3/12/26
mar 3/3/26
mar 3/3/26
lun 3/9/26
jue 3/12/26
lun 3/2/26
mar 3/3/26
mié 3/4/26
jue 3/12/26
jue 3/26/26
mar 3/10/26
lun 3/9/26
mar 3/10/26
mié 3/11/26
mar 3/10/26
mié 3/11/26
jue 3/12/26
mar 3/17/26

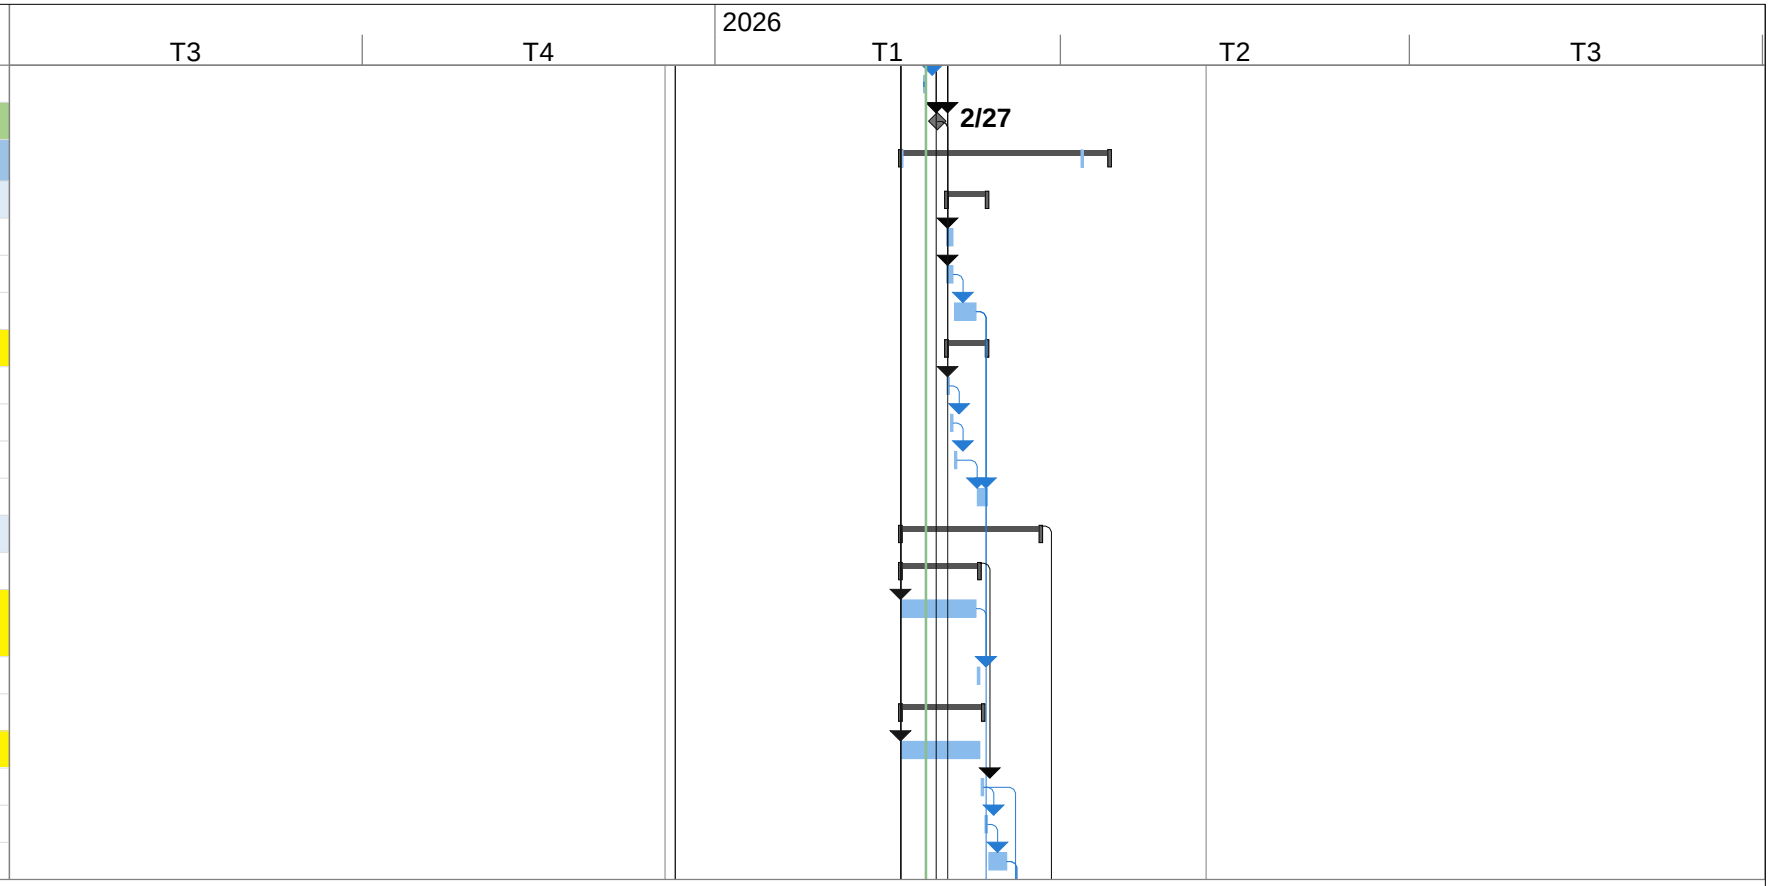

Proyecto: BC+IA - Gantt de Implementación.mpp
Fecha: mié 2/25/26

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

Fin
jue 3/19/26
mar 3/17/26
jue 3/19/26
vie 3/20/26
mié 3/18/26
vie 3/20/26
jue 3/26/26
mié 3/25/26
vie 3/6/26
vie 3/20/26
mié 3/25/26
mié 3/25/26
mar 3/10/26
mar 3/3/26
vie 3/6/26
vie 3/6/26
vie 3/20/26
mié 3/25/26
vie 3/20/26

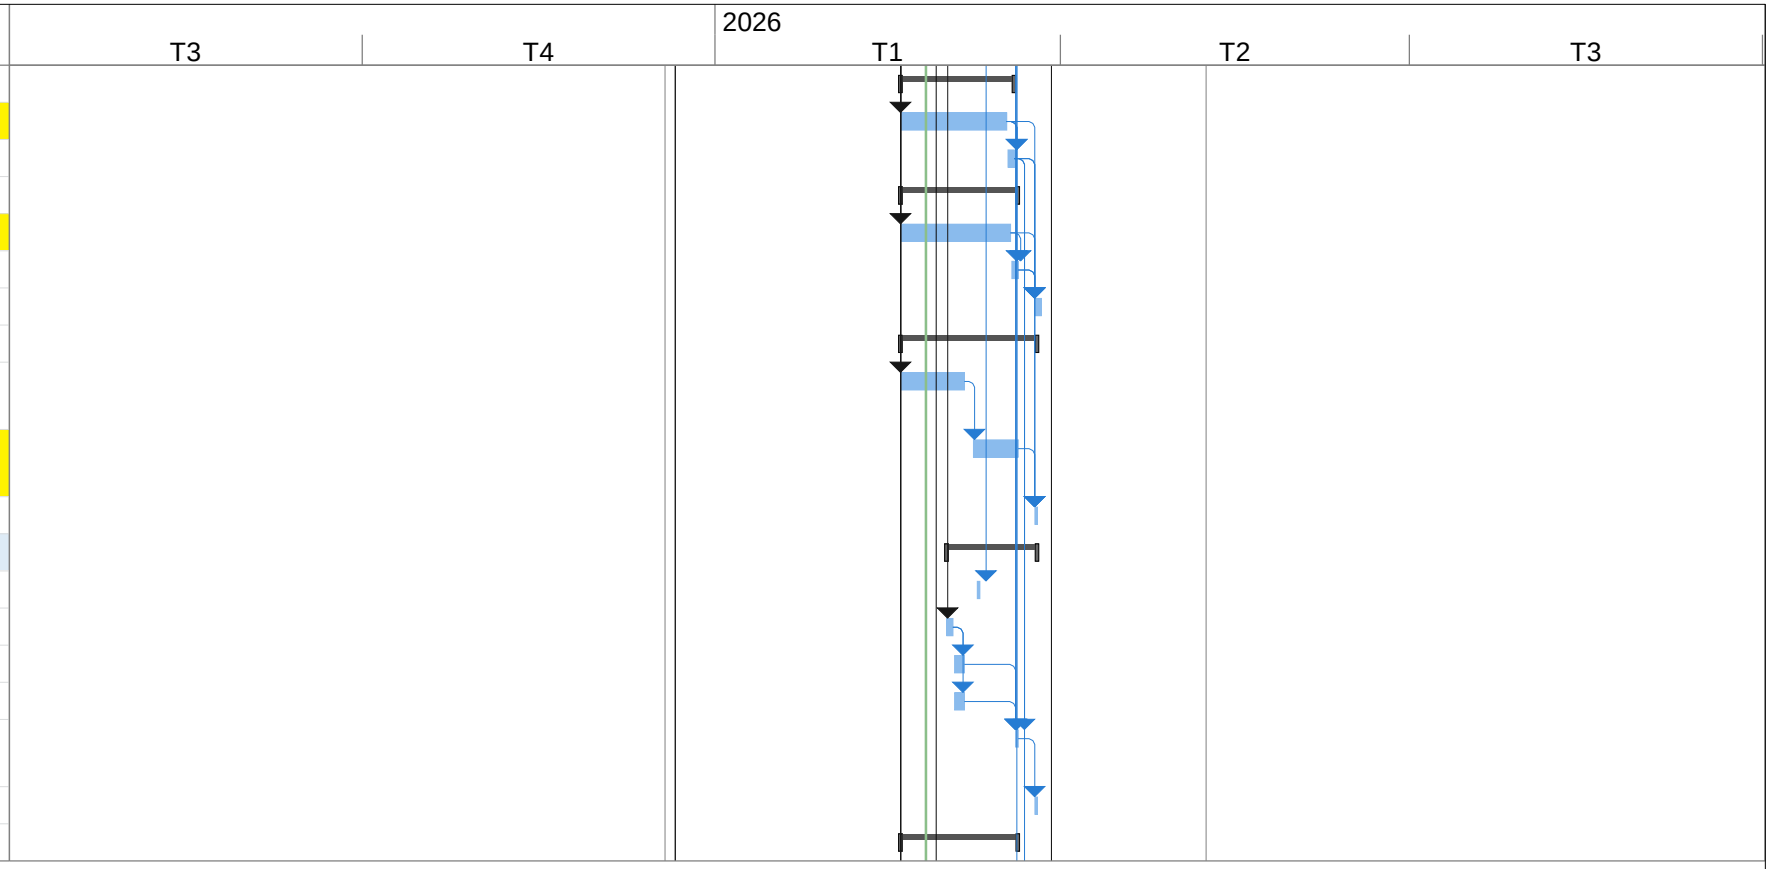

Proyecto: BC+IA - Gantt de Implementación.mpp
Fecha: mié 2/25/26

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

Fin
mié 2/18/26
vie 3/20/26
lun 3/30/26
mié 4/1/26
mié 4/1/26
lun 4/13/26
mié 2/18/26
lun 4/6/26
lun 4/6/26
lun 4/6/26
lun 4/6/26
lun 4/6/26
lun 4/6/26
lun 4/6/26
mar 4/7/26
mar 4/7/26
lun 4/13/26
lun 4/13/26
lun 4/27/26
mié 4/1/26
mié 4/1/26

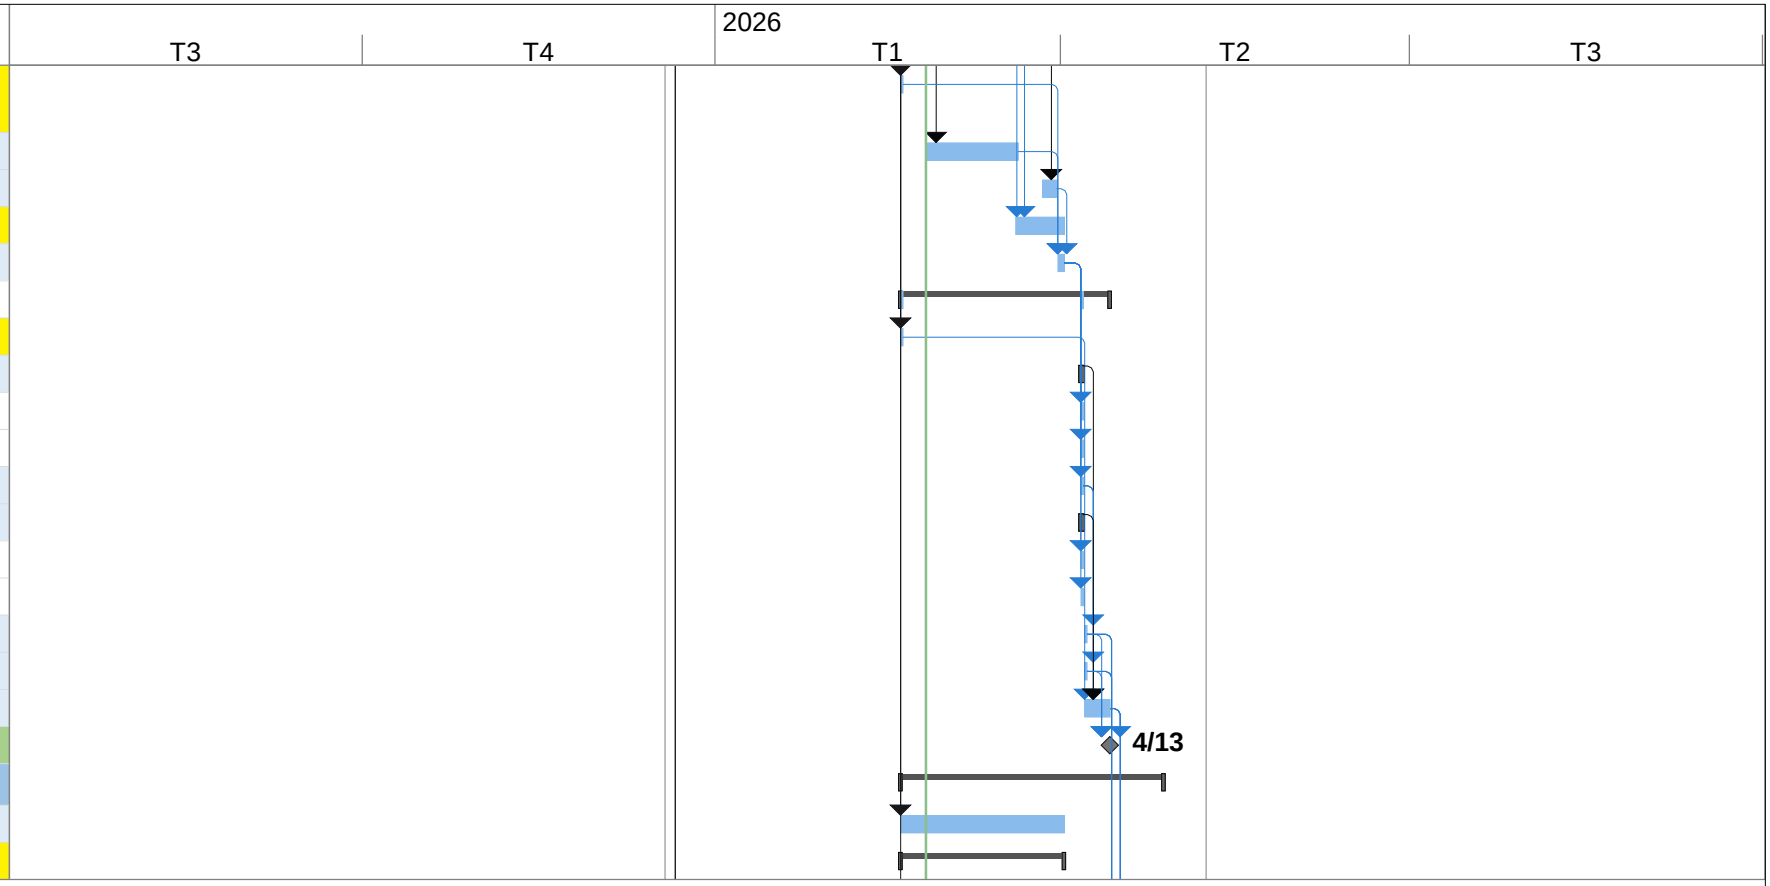

Proyecto: BC+IA - Gantt de Implementación.mpp
Fecha: mié 2/25/26

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

Fin
mar 3/31/26
mié 4/1/26
vie 4/10/26
lun 4/27/26
lun 4/27/26
mié 4/22/26
lun 4/20/26
lun 4/20/26
lun 4/20/26
vie 12/19/25
mié 4/22/26
mié 4/22/26
mié 4/22/26
vie 12/19/25
mar 4/21/26
mar 4/21/26
mar 4/21/26
mar 4/21/26
mar 4/21/26

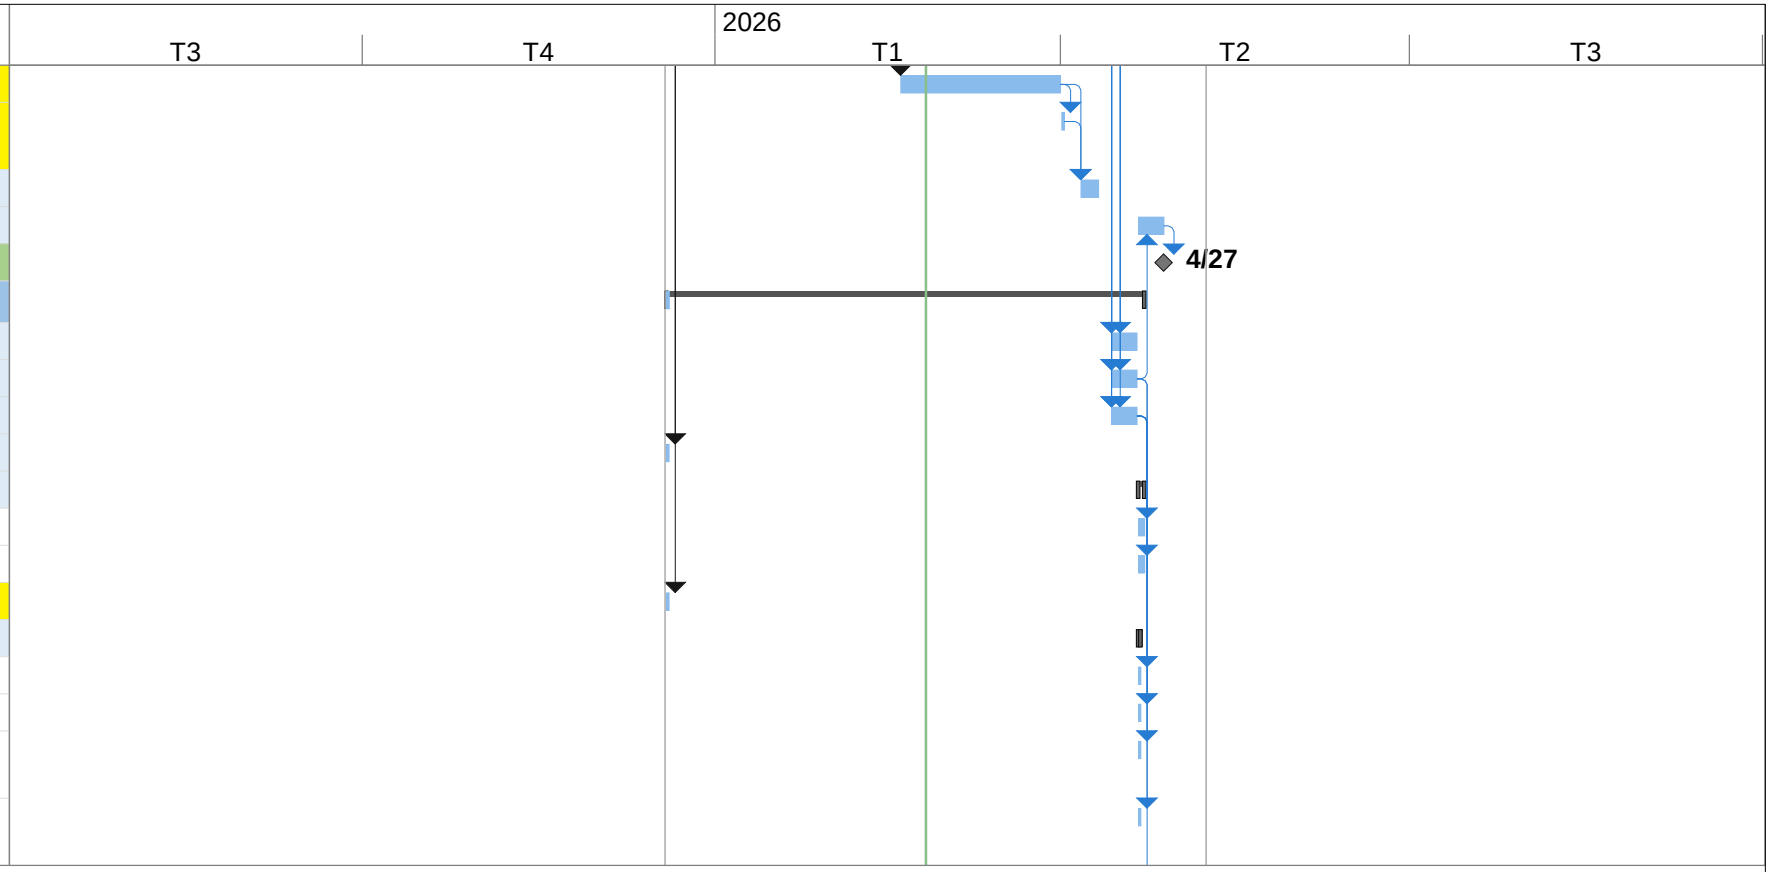

Proyecto: BC+IA - Gantt de Implementación.mpp
Fecha: mié 2/25/26

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

Fin	2026			
	T3	T4	T1	T2	T3
mar 4/21/26				
mar 4/28/26				
mar 4/28/26				
mar 4/28/26				4/28
vie 5/8/26				
vie 5/8/26				
vie 5/8/26				5/8

Proyecto: BC+IA - Gantt de Implementación.mpp
Fecha: mié 2/25/26

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			
